

DRUCKPRÜFUNG VON PRIPRESS TRINKWASSERINSTALLATIONEN

Druckprüfprotokoll nach DIN EN 806-4 für **PRIPRESS** Trinkwasserinstallationen

Objekt: _____

Bauherr: _____

Prüfer: _____

Bezeichnung Prüfabschnitt


16 x 2,0 _____ m

20 x 2,0 _____ m

26 x 3,0 _____ m

32 x 3,0 _____ m

40 x 3,5 _____ m

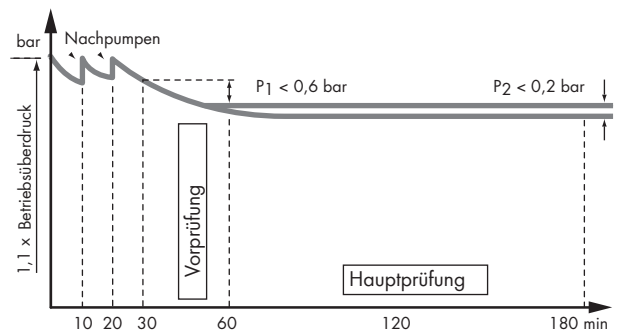

Vorprüfung (Dauer 30 Minuten)

Beginn ____ : ____ Uhr Ende ____ : ____ Uhr

Prüfdruck (1,1 x Betriebsdruck) _____ bar

Druck nach 30 Minuten _____ bar

Druck nach 60 Minuten
(Ende Vorprüfung) _____ bar

Druckabfall (max. 0,6 bar): _____ bar

HINWEIS

Die Temperatur des Prüfmediums sollte möglichst konstant gehalten werden. Leitungen mit Wasser füllen. Leitungen vollständig entlüften.

Hauptprüfung (Dauer 2 Stunden)

Beginn ____ : ____ Uhr Ende ____ : ____ Uhr

Prüfdruck Ende der Vorprüfung _____ bar

Prüfdruck nach 2 Stunden _____ bar

Druckabfall (max. 0,2 bar) _____ bar

Ergebnis der Vor- und Hauptprüfung

Druckprüfung bestanden ja nein

Sichtprüfung bestanden ja nein

Ort, Datum

Unterschrift Prüfer

Unterschrift Bauherr o. Vertreter
